

IV. ÜTEM - KISS ERNŐ UTCAI VÍZ- ÉS SZENNYVÍZVEZETÉK REKONSTRUKCIÓ

2023. június 12-én már a IV. ütemébe lépnek a kivitelezési munkálatok a Kiss Ernő utcában a **KEHOP-2.1.11-21-2022-00014** kódszámú, **„Víziközmű-hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécssett”** tárgyú projekt keretében.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Kiss Ernő utcában – a Vadász utcától a Vöröskereszt utcáig tartó szakaszon – víz- és szennyvízvezeték rekonstrukciós munkálatok folynak, nyílt árkos technológiával. A kivitelezés keleti irányból, a Vadász utcai kereszteződéstől indult 2023. március végén és fokozatosan halad nyugat felé, **június 12-től éri el a Dugonics utca és Vöröskereszt utca közötti IV. ütemet**. Mivel az utca túlságosan keskeny, így a kivitelezési munkálatok teljes útzár mellett valósulnak meg augusztus 11. napjáig.

Változások a II. és III. ütemben:

A kivitelezés megkezdésével a II. és III. ütem területén a **Rippl-Rónai utca – Dugonics utca közötti szakaszon még nem áll vissza az eredeti forgalom**. Ezen szakasz munkálatai eredetileg június 19-ig tartottak volna, viszont az elmúlt hetekben először a csapadékos időjárás következményeként, majd pedig a sziklás altalaj okozta lassúbb bontási lehetőségek miatt a kivitelező 4 hetes csúszást jelentett be. Emiatt **ennek a szakasznak a munkálatai várhatóan csak július 21. napjával fognak befejeződni**.

A tervezett ütemezésbe azon tartalékidő is beépítésre került, amely ahhoz kell, hogy további csúszás már ne legyen a tervezett határidőhöz képest. A kivitelező törekszik arra, hogy az elkészült, helyreállított területek minél hamarabb, szakaszosan visszakerülhessenek a napi használatba. **Június 12-én egyelőre csak a Vadász utca és a Rippl-Rónai utca közötti szakasz kerül teljes átadásra a forgalomnak**, viszont a munkálatok előrehaladtával a kivitelező a további munkaterületeken is folyamatosan állítja maga után helyre a munkagödröket, nyitja fel a keresztezéseket.


IV. ütem: 2023. június 12. – augusztus 11.

Kiss Ernő utca Dugonics utca – Vöröskereszt utca közötti szakasza

A **IV. ütemben 2023. június 12. és 2023. augusztus 11. között a Kiss Ernő utca Dugonics utca – Vöröskereszt utca közötti szakaszán folynak a víziközmű-rekonstrukció kivitelezési munkálatok** az utcaszakasz teljes lezárásával.

A **IV. ütem munkálatai** idején a Dugonics utca, a Sándor utca és a Vöröskereszt utca, a Fischer Béla utca és az Ady Endre utca irányából is zsákutca lesz, ahogy a II. ütemben érintett Béla utca is az Újvilág utca és az Ady Endre utca irányából. A Csillag utca és a Rippl-Rónai utca teljes hosszában átjárható marad, utóbbi a Kiss Ernő utcánál félpályás útszűkülettel.

A teljes lezárással érintett időszak idején a Kiss Ernő utcai ingatlanokra a gépkocsival történő be- és kihajtás nem lesz lehetséges, ugyanakkor a hatósági járművek (mentők, tűzoltók, rendőrség) közlekedését biztosítják.

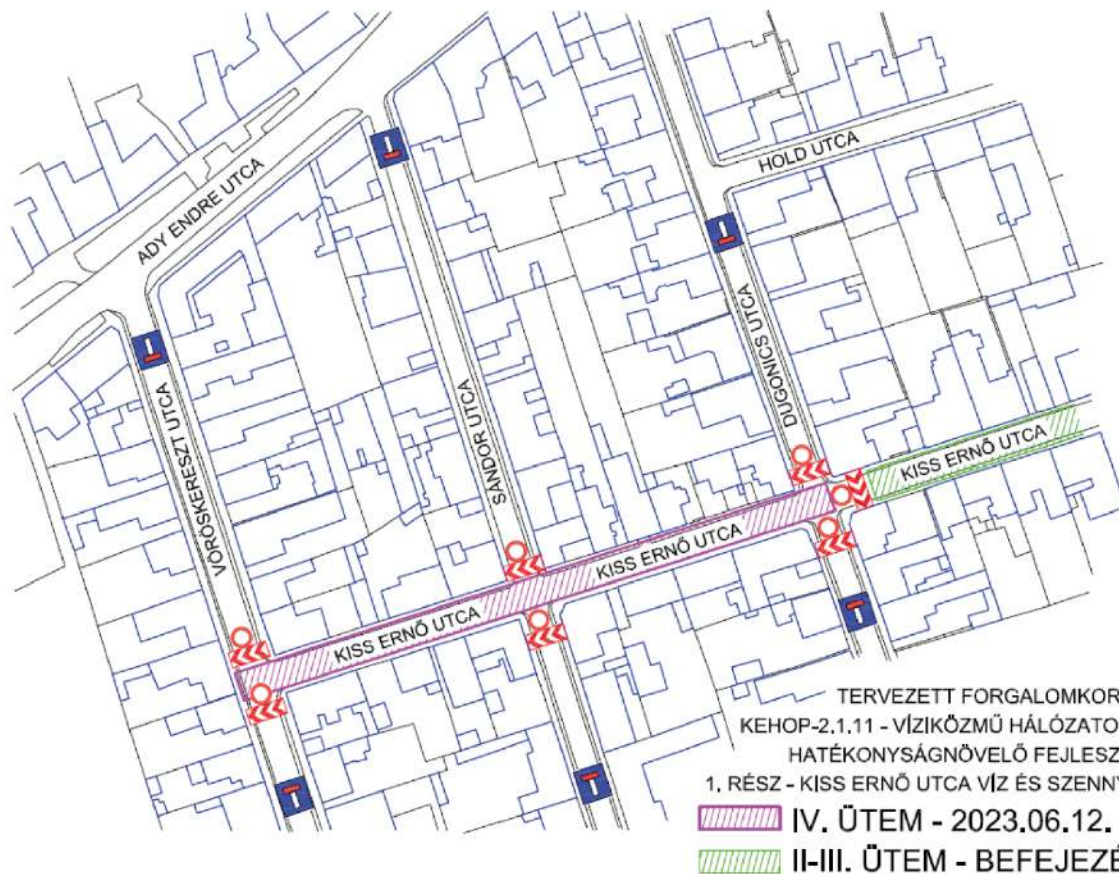

A kommunális hulladékelszállítás rendje annyiban változik, hogy a Kiss Ernő utcában a kivitelezéssel érintett lezárt szakaszon a hulladéktároló edények részére ideiglenes gyűjtőterületet jelölnek ki a IV. ütemben a Kiss Ernő utca és a Dugonics utca csomópont északnyugati ágán, a Kiss Ernő utca és Sándor utca csomópont északnyugati ágán, és a Kiss Ernő utca és Vöröskereszt utca csomópont északnyugati ágán is.

A Kiss Ernő utcát érintő munkálatok befejezésével megtörténik majd a teljes utca útburkolati helyreállítása is. Az utca teljes hosszában egységesen, teljes szélességében új burkolatot fog kapni, az aszfaltozási munkálatok **a IV. ütem lezárása után fognak megtörténni várhatóan augusztus végéig.**

A Kiss Ernő utcai víziközmű rekonstrukció mellett a projekthez kapcsolódóan a város más pontjain is számítani lehet forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra. A projekt részleteiről folyamatos tájékoztatást adunk az alábbi honlapon: pecs.hu/kehop-2-1-11-21-2022-00014

Az egész várost érintő útfelújításokkal és lezárásokkal kapcsolatban az erre a célra létrehozott városi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: pecsutfelujitasok.hu

Kérjük a tisztelt pécsieket, hogy a kivitelezési munkálatok idején körültekintően és fokozott türelemmel közlekedjenek.

A teljes közmű-infrastruktúra fejlesztés projekt megvalósítása tervezetten 2023. év végéig tart.



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
köszöni a lakók és a közlekedők
együttműködését és türelmét,
amellyel segítik a beruházás
megvalósulását.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
